



Instandsetzung der Staatsstraße 2083 in Vilsbiburg: Vorstellung der Maßnahme

Marietta Vockinger

Bauberrätin

Staatliches Bauamt Landshut, Sonderaufgaben Straßenbau

Agenda

- Anlass
- Details aus der Planung
- Bauphasen/ Bauablauf



Anlass

Ziele

- Instandsetzung zum Erhalt der dauerhaften Tragfähigkeit
- Erhöhung Verkehrssicherheit
- Verbesserung der Geh- und Radlersituation
- Verbesserung der Barrierefreiheit

Beteiligte

- Staatliches Bauamt Landshut
- Stadt Vilsbiburg
- Landkreis Landshut
- Stadtwerke Vilsbiburg

Übersichtslageplan



- Ausbaulänge: 1.370 m
- 6 Bauabschnitte
- Bauausführung Mai 2022 bis September 2023




Instandsetzung der Staatsstraße 2083 in Vilsbiburg: Details aus der Planung


Bernhard Pritscher

BBI Ingenieure GmbH


Bauabschnitt BA1: Bereich Pfarrbrückenweg

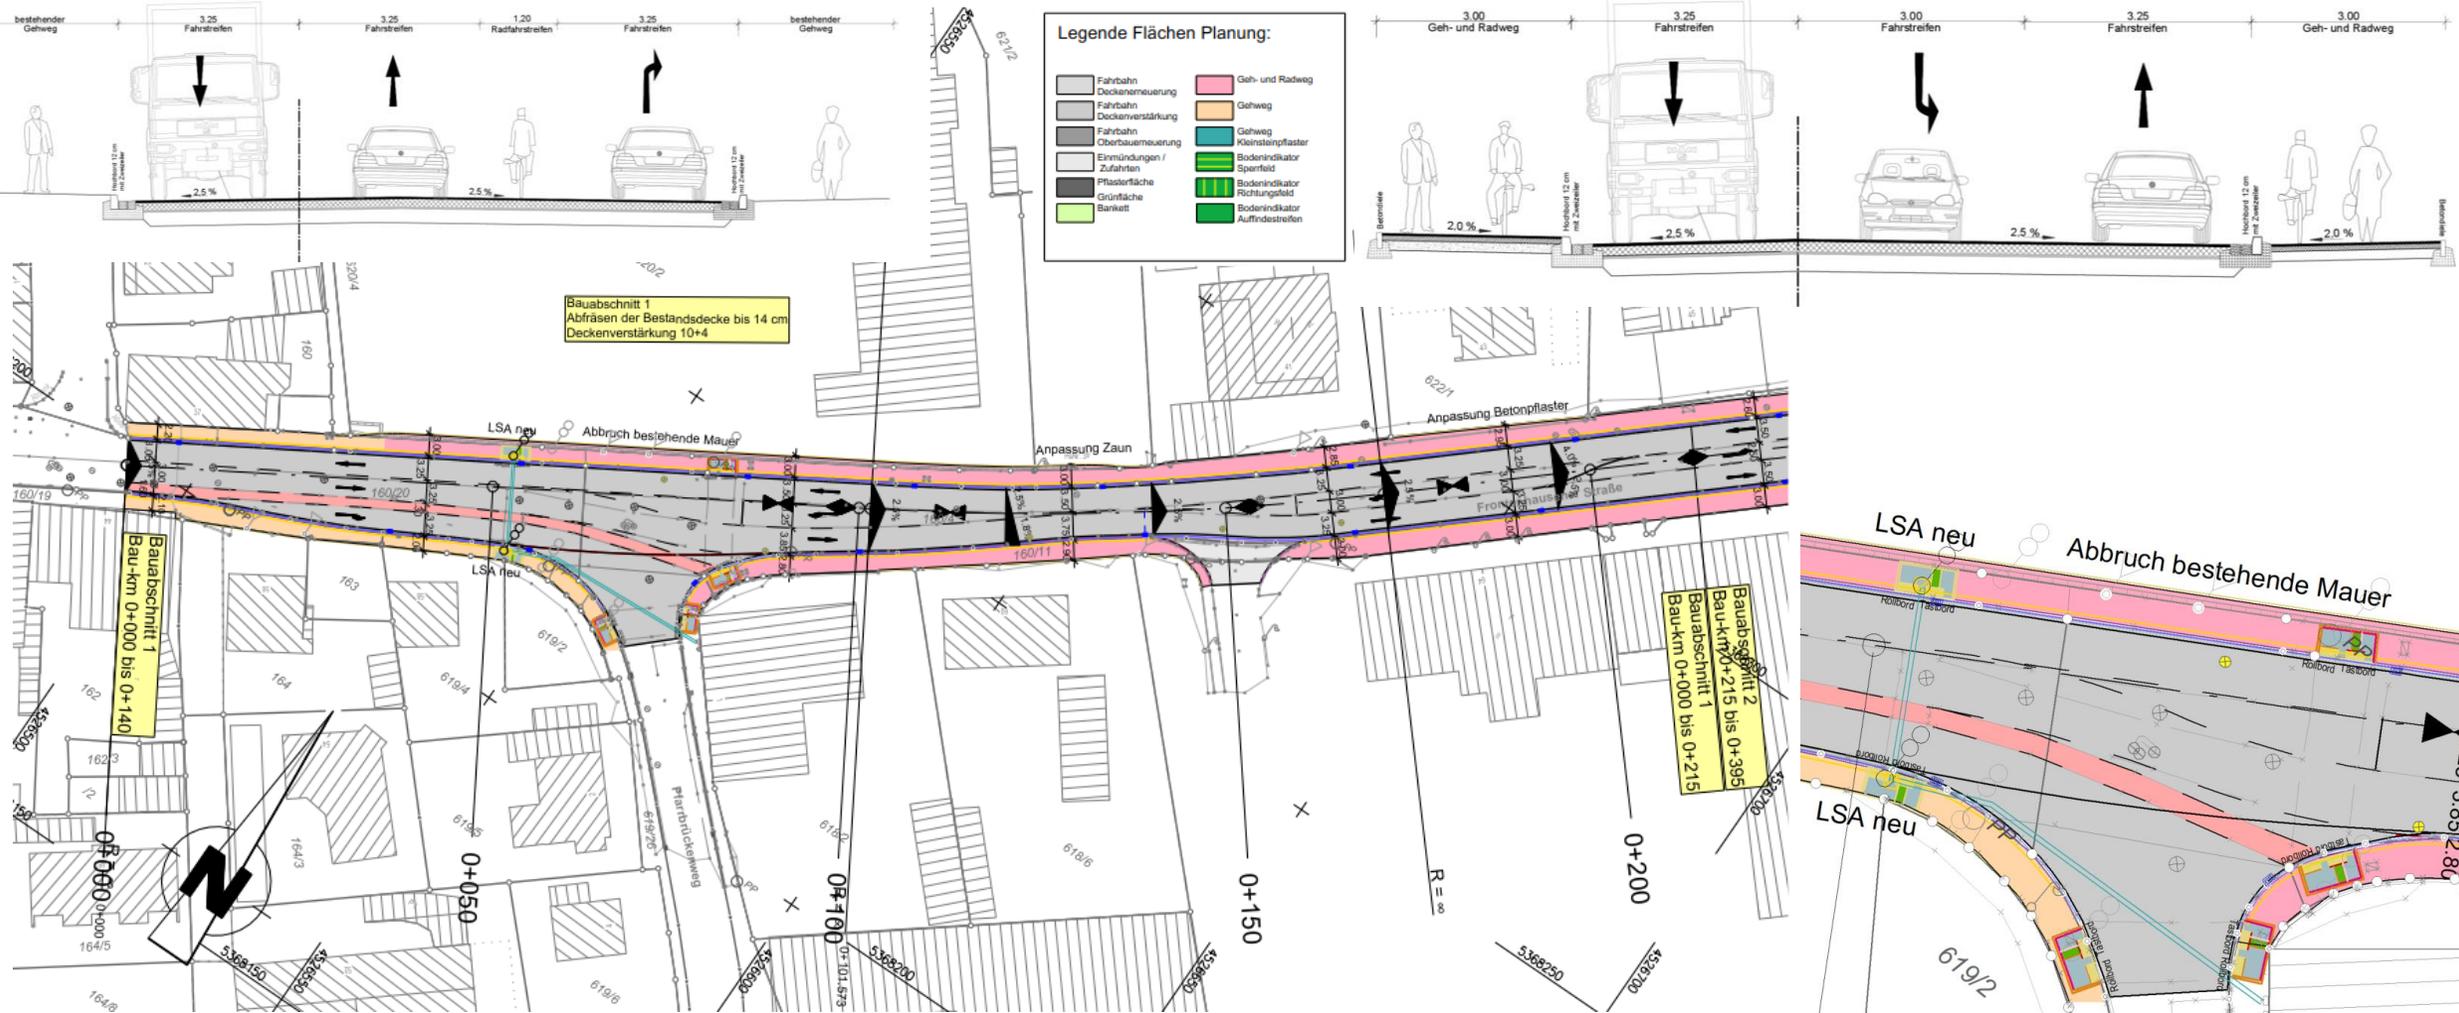



Bauabschnitt BA 2: Bereich Einkaufszentrum Vilsbiburg

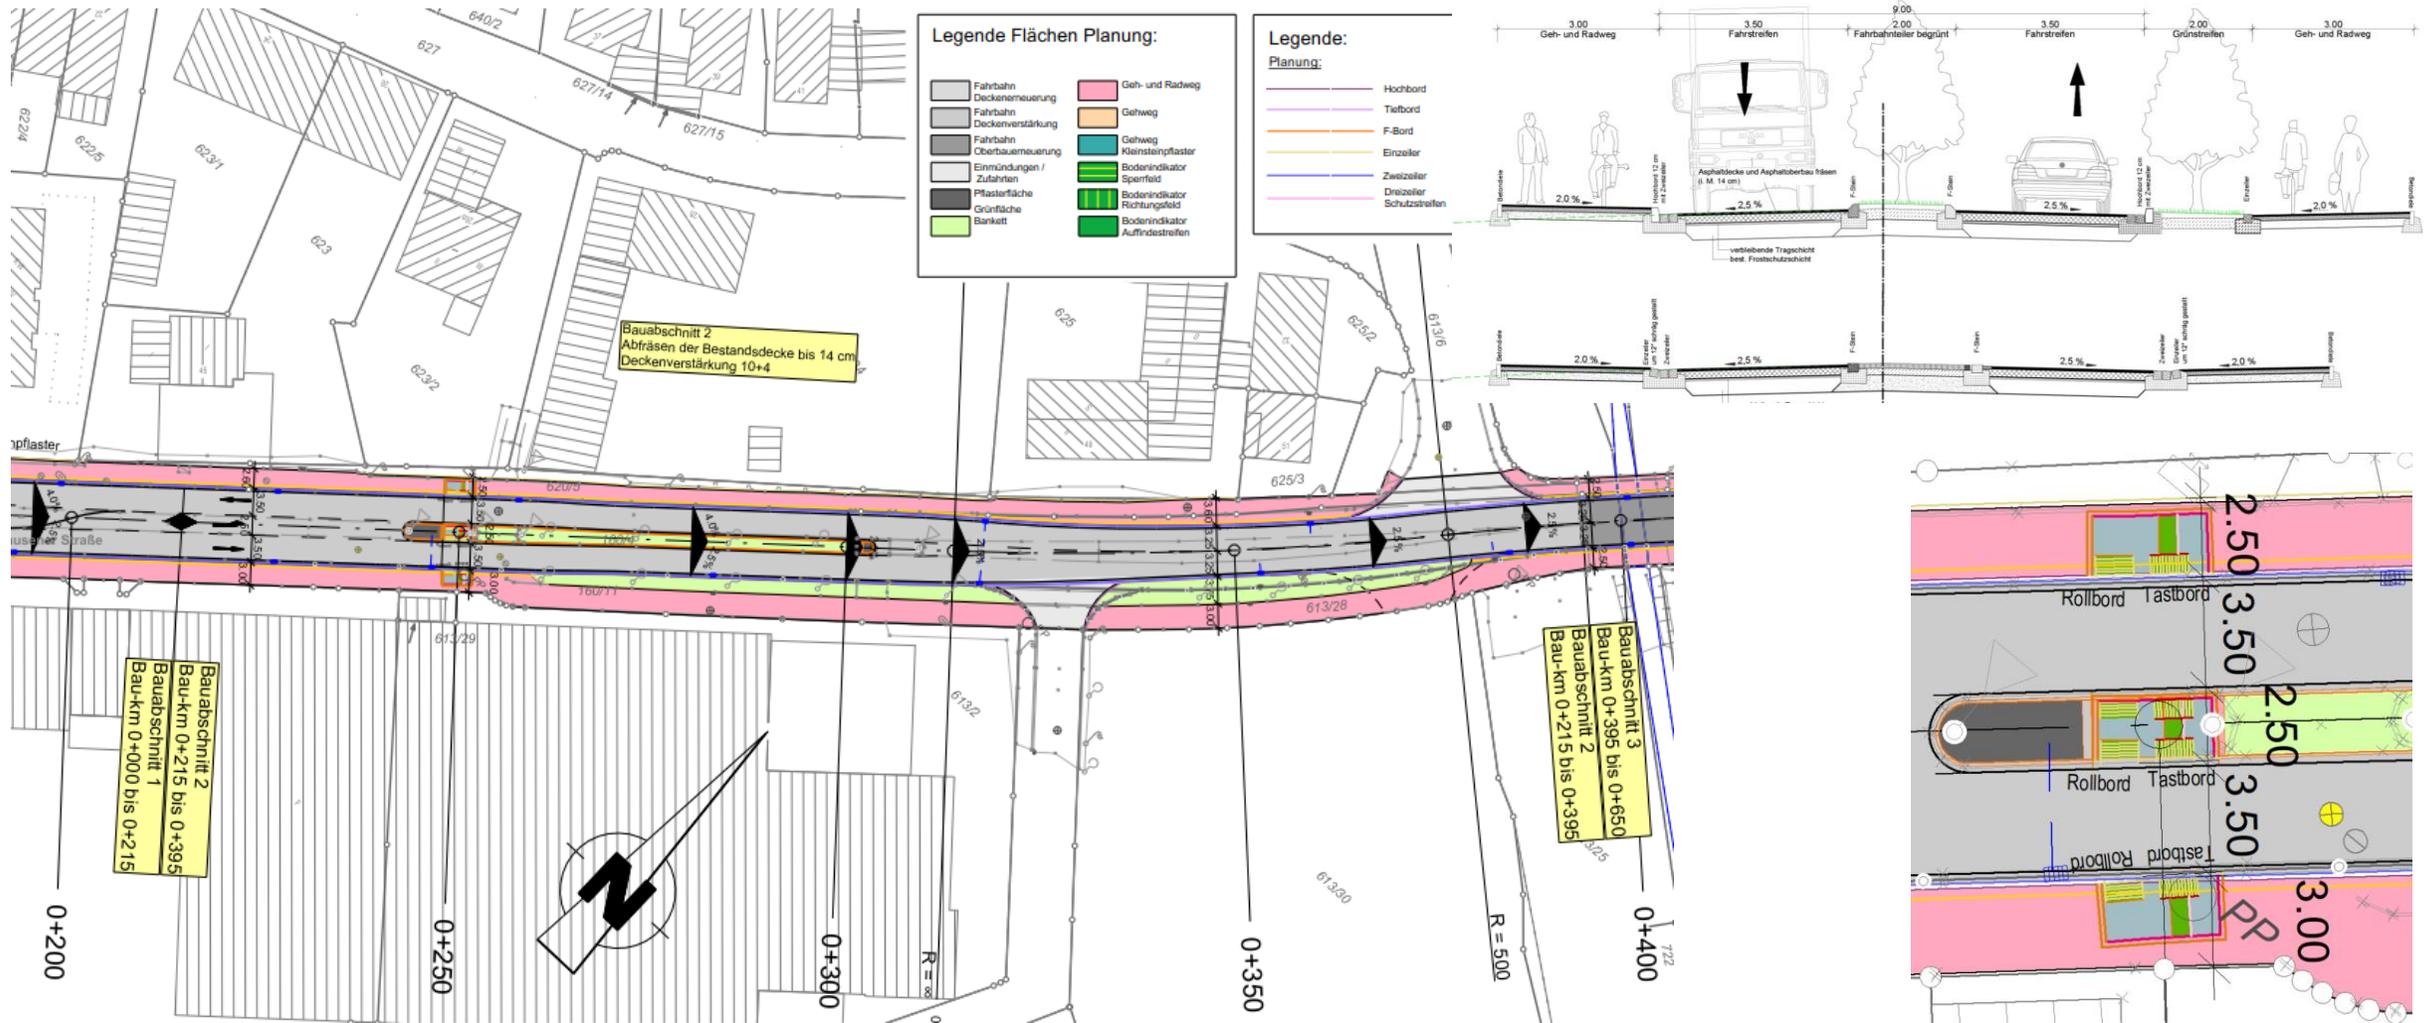

Bauabschnitt BA 3: Bereich zwischen Kindlmühlestraße und Gartenstraße

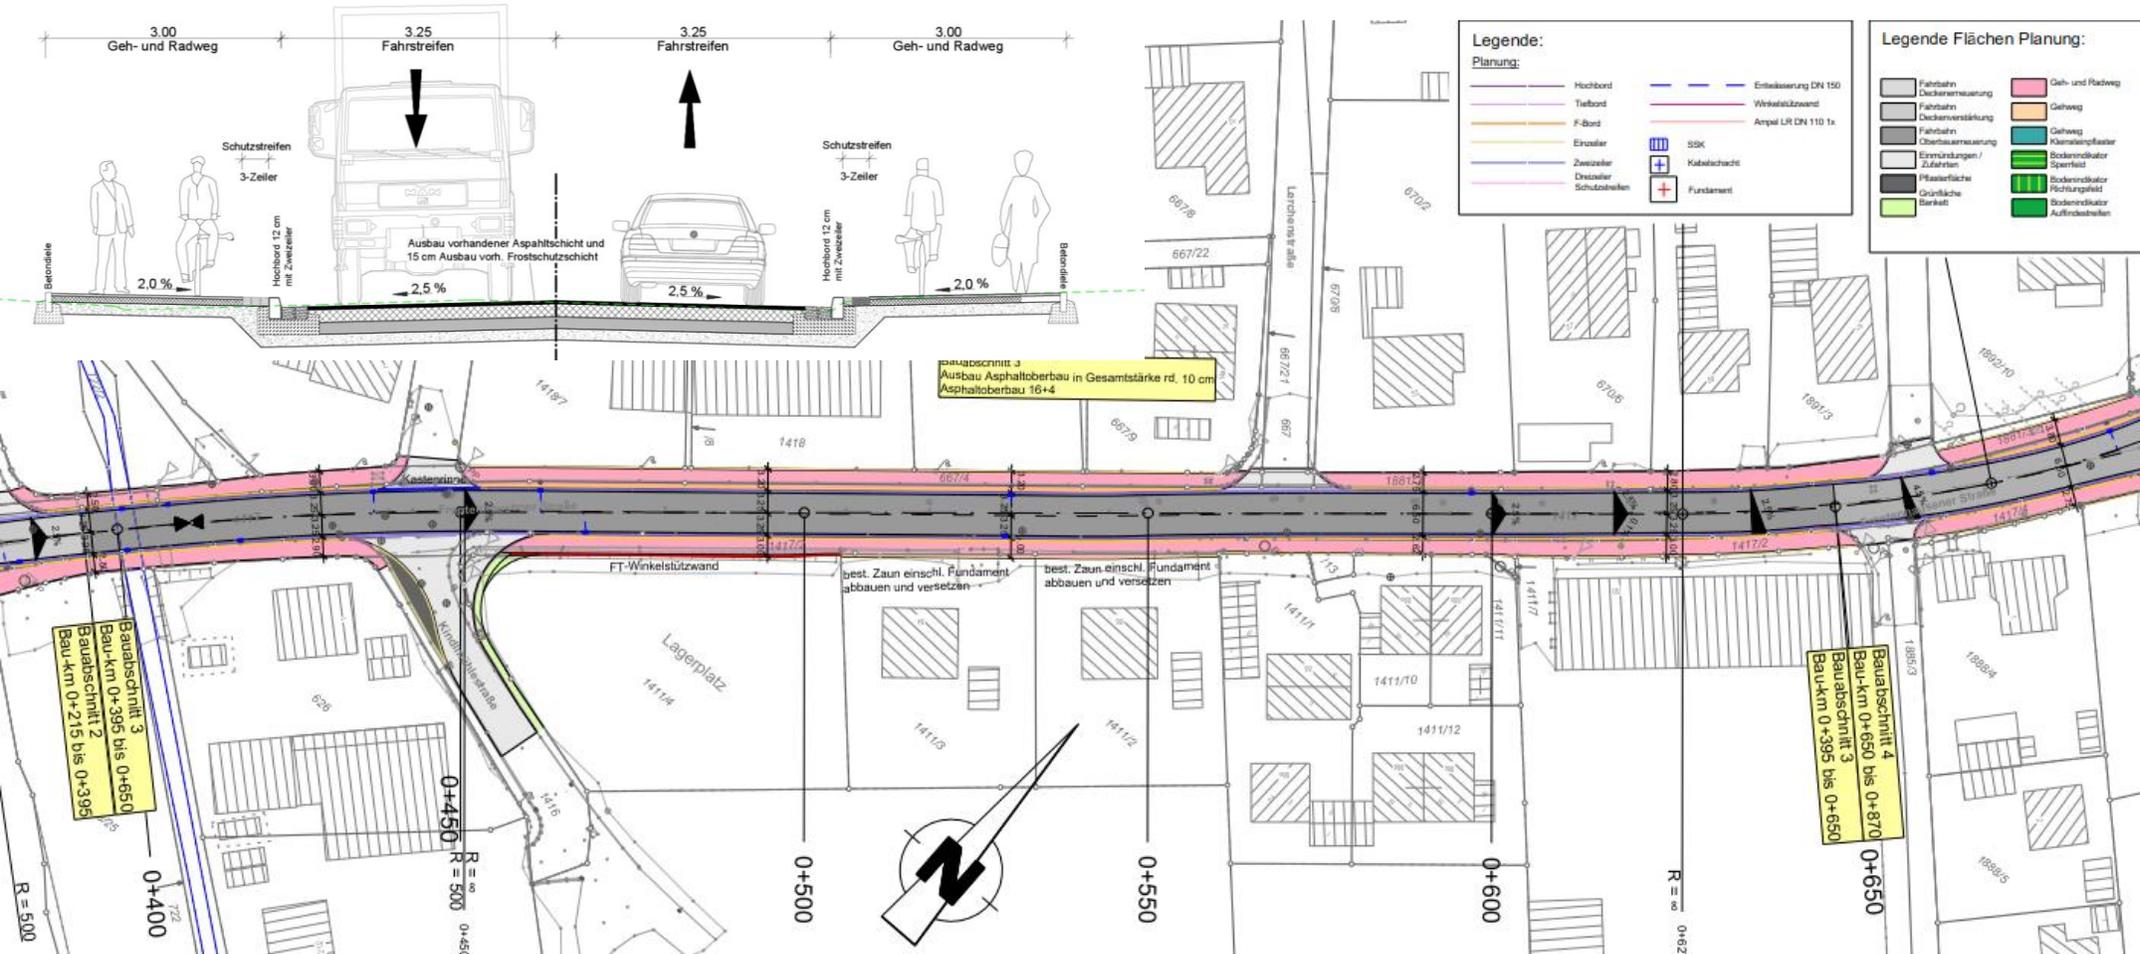

Bauabschnitt BA 6: Bereich zwischen Schachtengraben und Mühlen

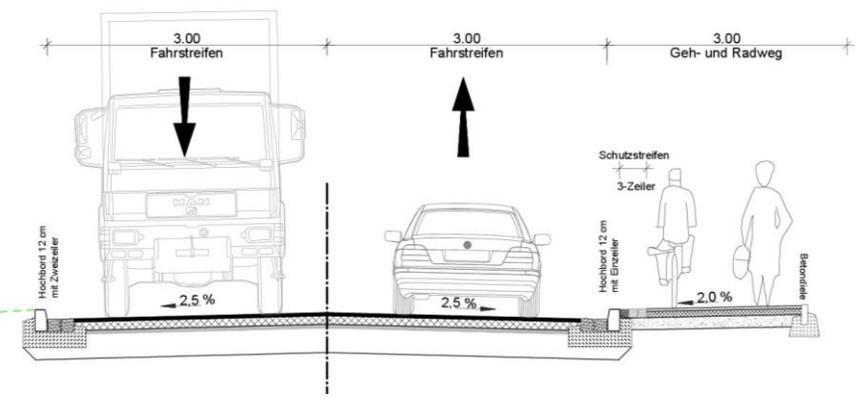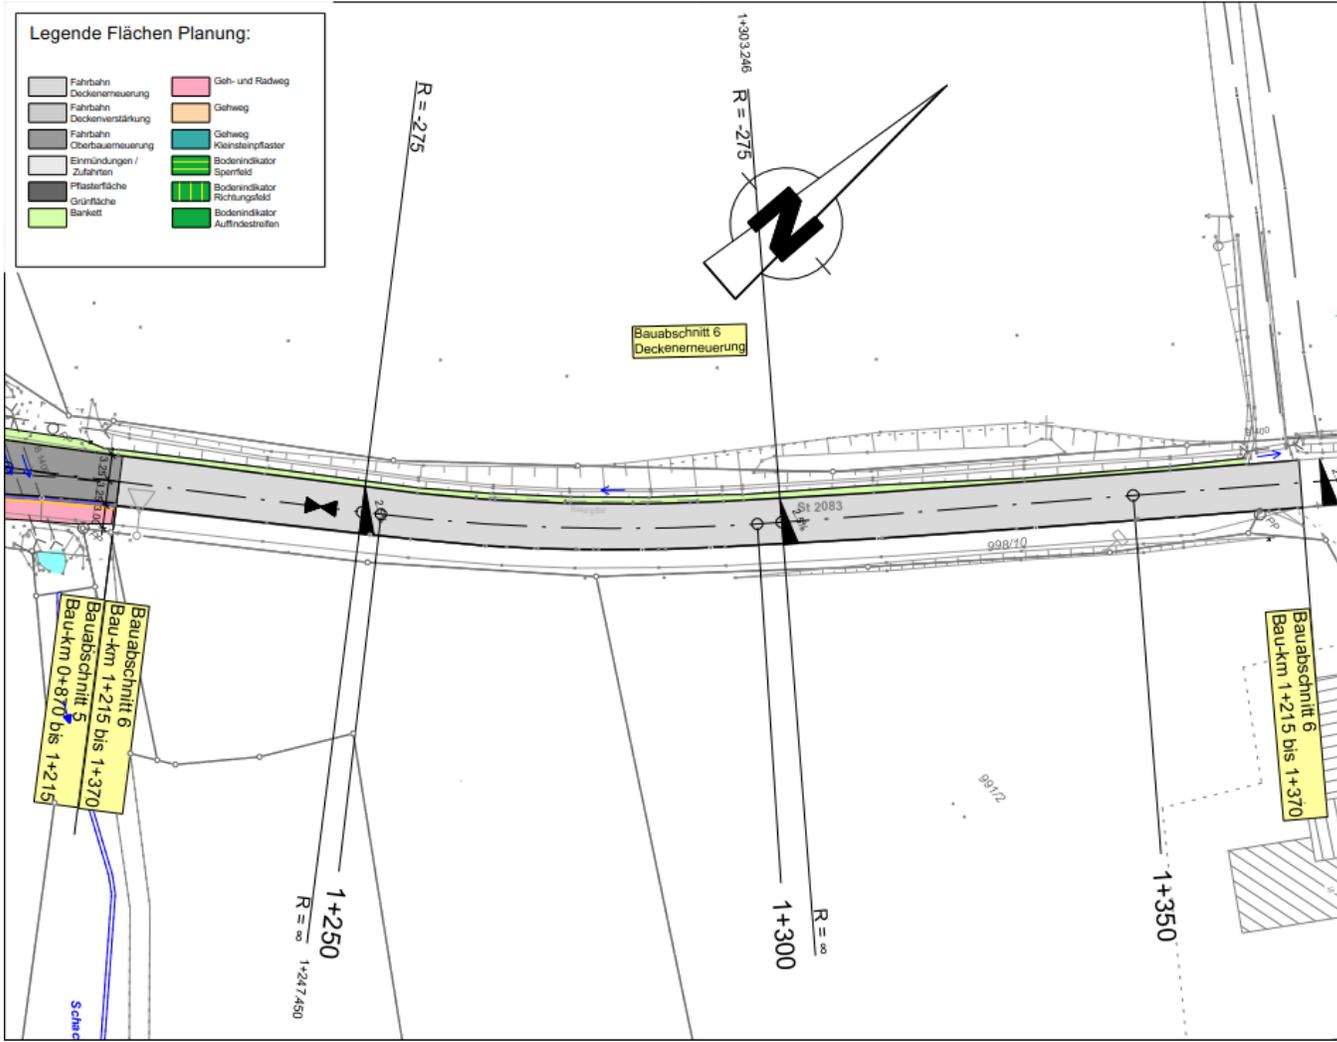



Instandsetzung der Staatsstraße 2083 in Vilsbiburg: Bauablauf / Bauphasen

Bernhard Pritscher

BBI Ingenieure GmbH

Bauablauf/ Bauphasen


Grundsätze

- Großräumige LKW-Umleitung
- Kleinräumige Umleitungen auch für PKW
 - Mehrstufiges Ableiten vor der Baustelle
 - Verkehrsverteilung zur Reduzierung der Verkehrsmenge im Baustellenbereich
- Vorbeifahren am Arbeitsbereich für Anlieger weitgehendst möglich
 - Ausnahme: Deckschichteinbau mit Vollsperrung
 - Direkte Arbeiten im jeweiligen Zufahrtsbereich mit kurzzeitigen Sperrungen
- Aufteilung der Baumaßnahme auf 2 Jahre
 - Bauabschnitte BA 1 bis BA 3 -> 2022
 - Bauabschnitte BA 4 bis BA 6 -> 2023




Bauablauf/ Bauphasen

Kleinräumige Umleitung Mai bis Juni 2022

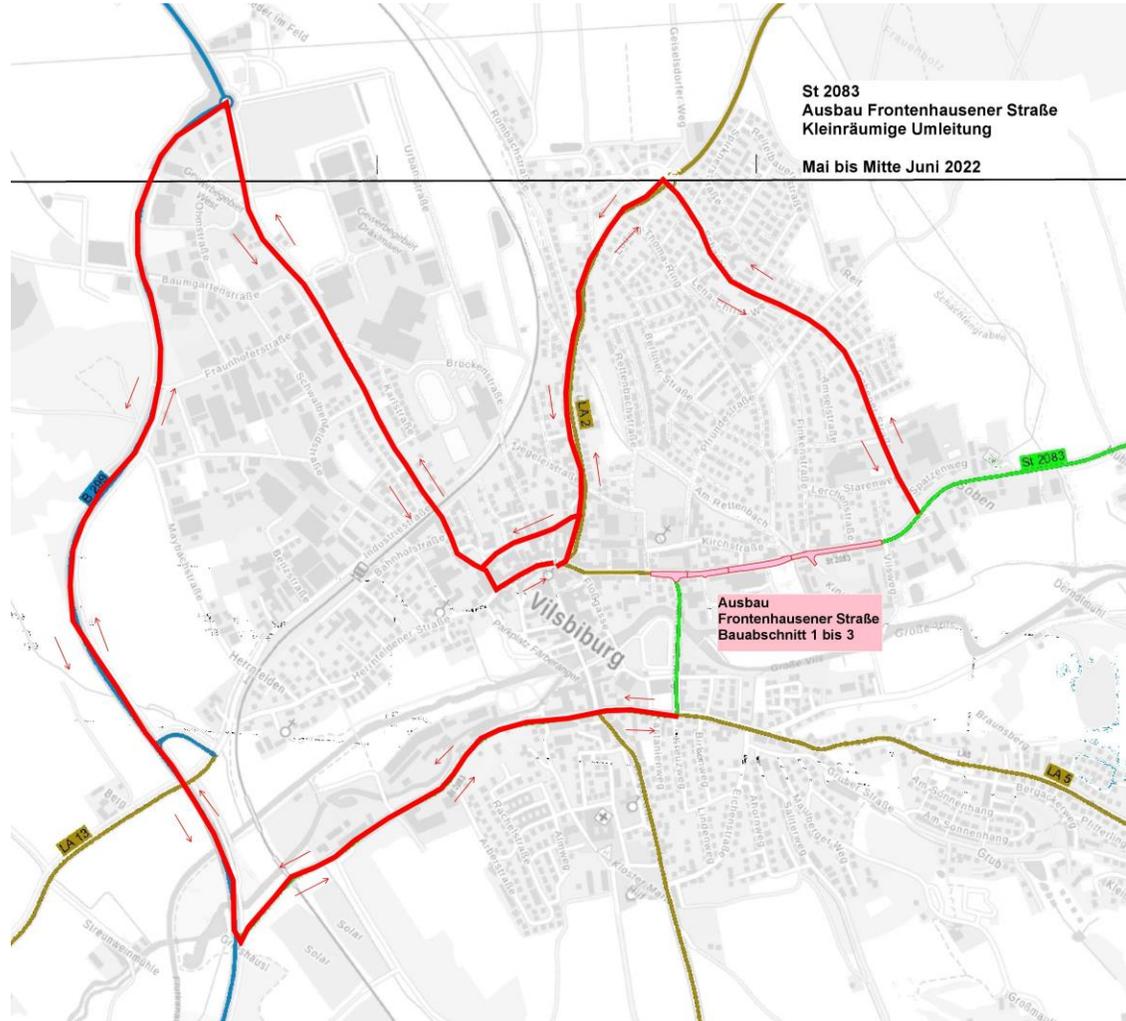

Kleinräumige Umleitung Juni bis November 2022

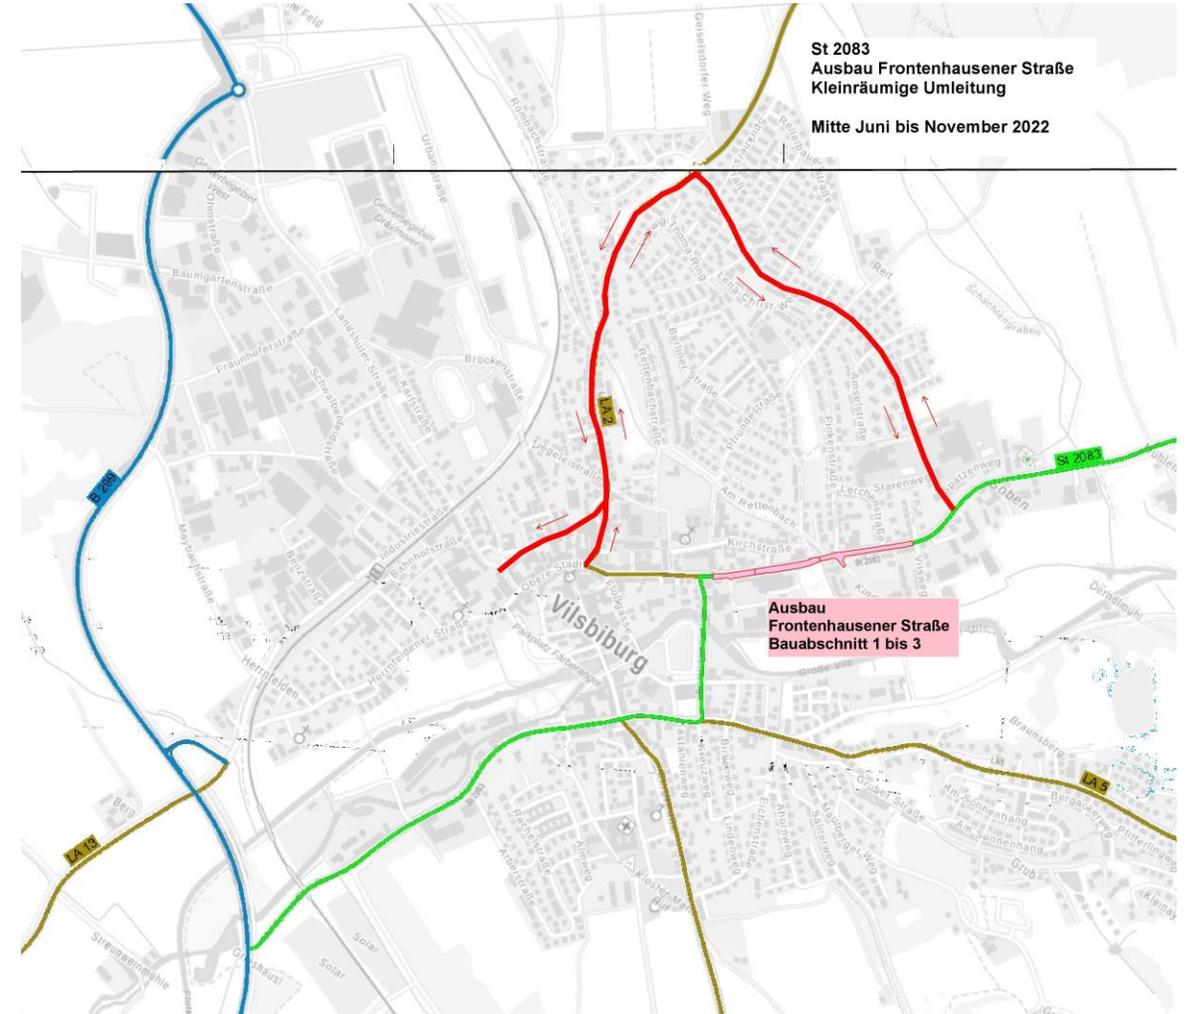


Bauablauf/ Bauphasen

Kleinräumige Umleitung März bis September 2023



Bauablauf/ Bauphasen

Bauabschnitt 1.1 – Einmündung Pfarrbrückenweg bis Tankstelle

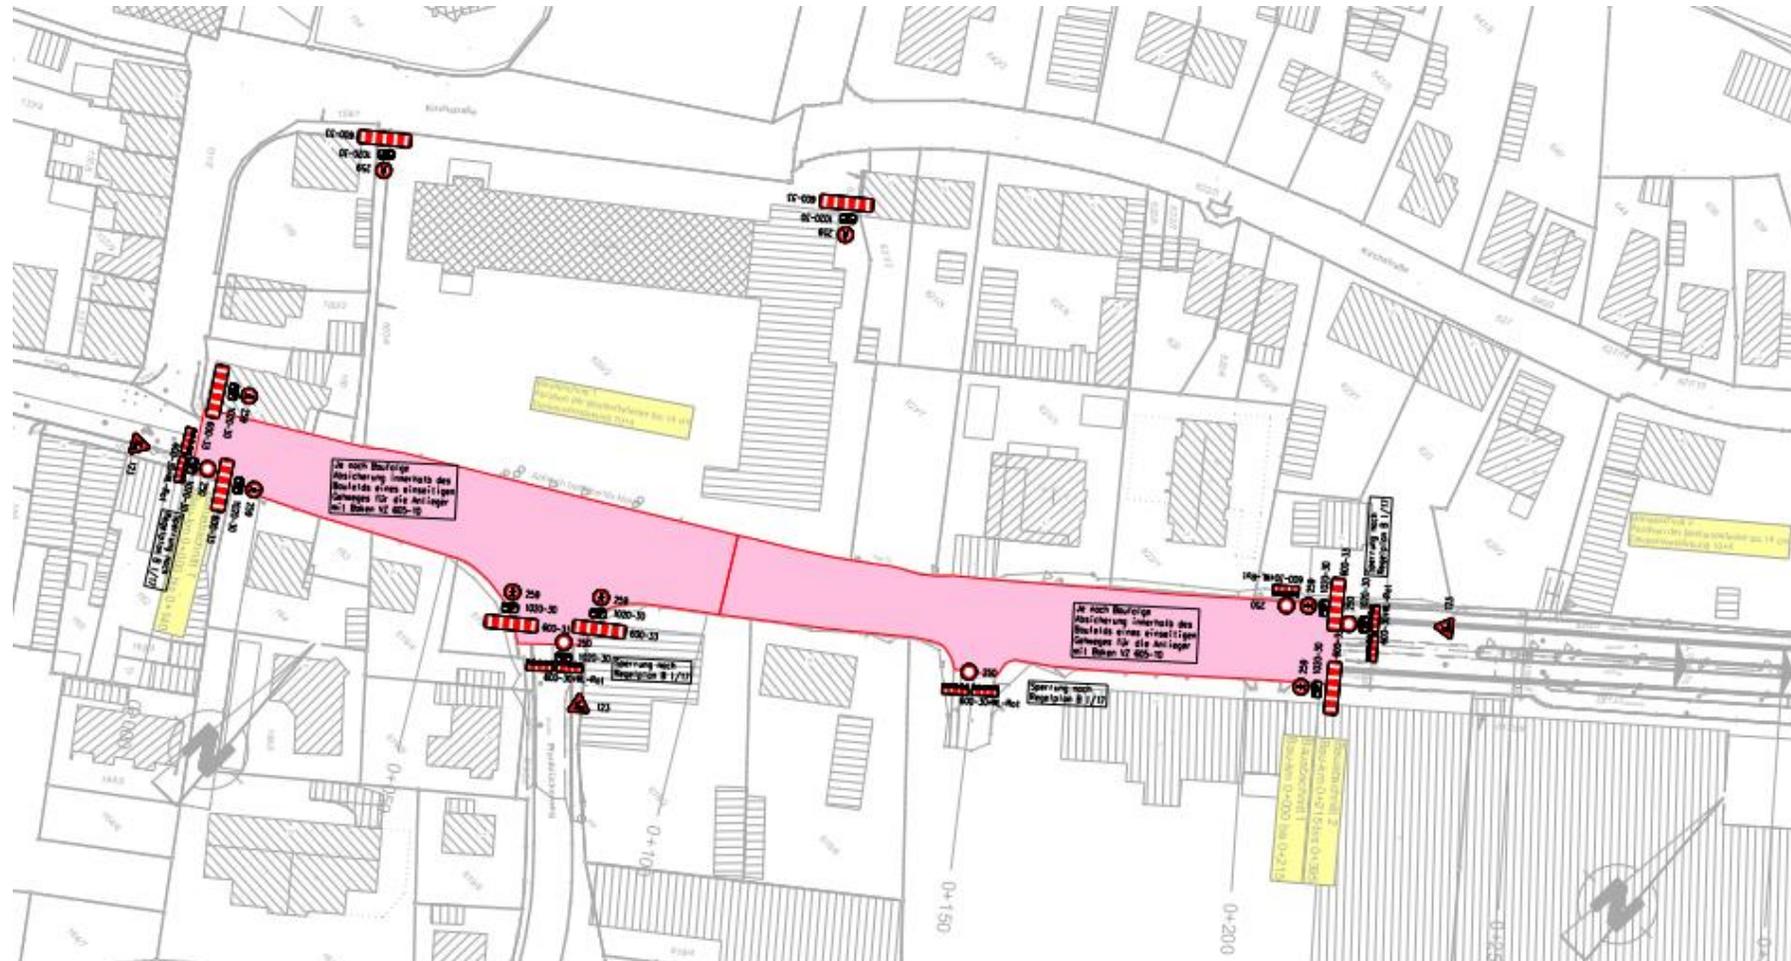

Mai bis Mitte Juni
2022


Dauer 6 Wochen

Kleinräumige
Umleitung

Großräumige
Umleitung LKW

Bauablauf/ Bauphasen

Bauabschnitt 1.2 – Einmündung Pfarrbrückenweg bis Tankstelle

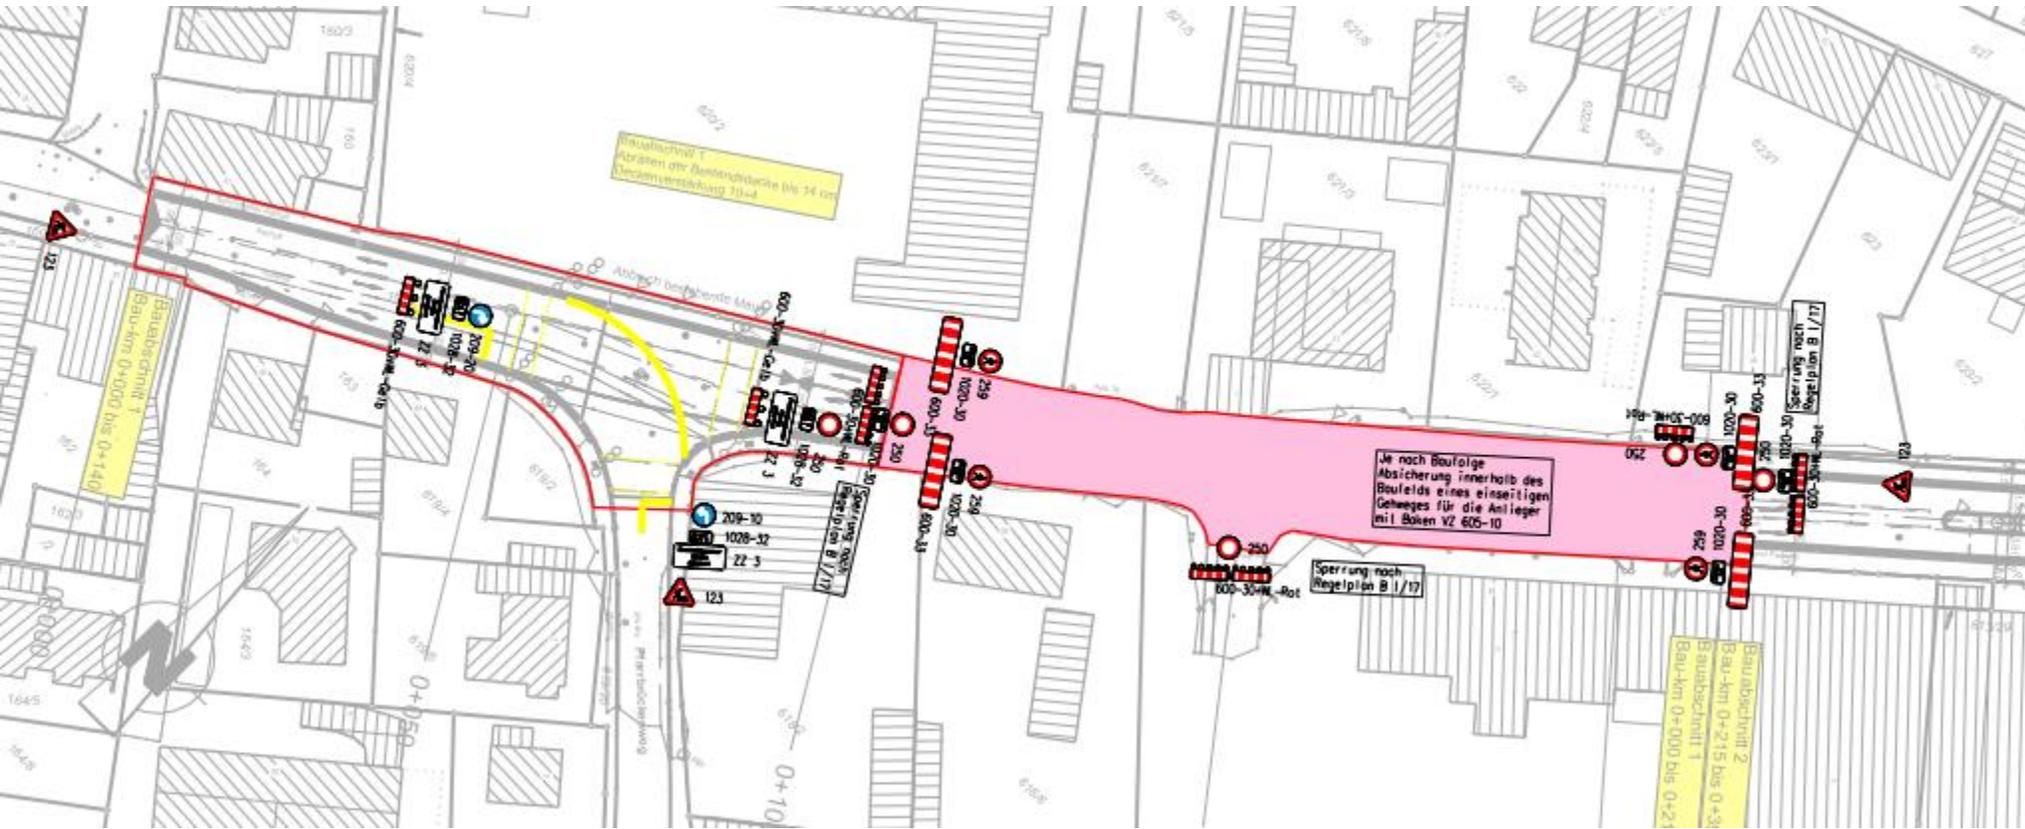

Mitte Juni bis Anfang Juli 2022


Dauer 3 Wochen

Kleinräumige Umleitung

Großräumige Umleitung LKW

Bauablauf/ Bauphasen

Bauabschnitt 2 – Bereich Einkaufszentrum Vilsbiburg

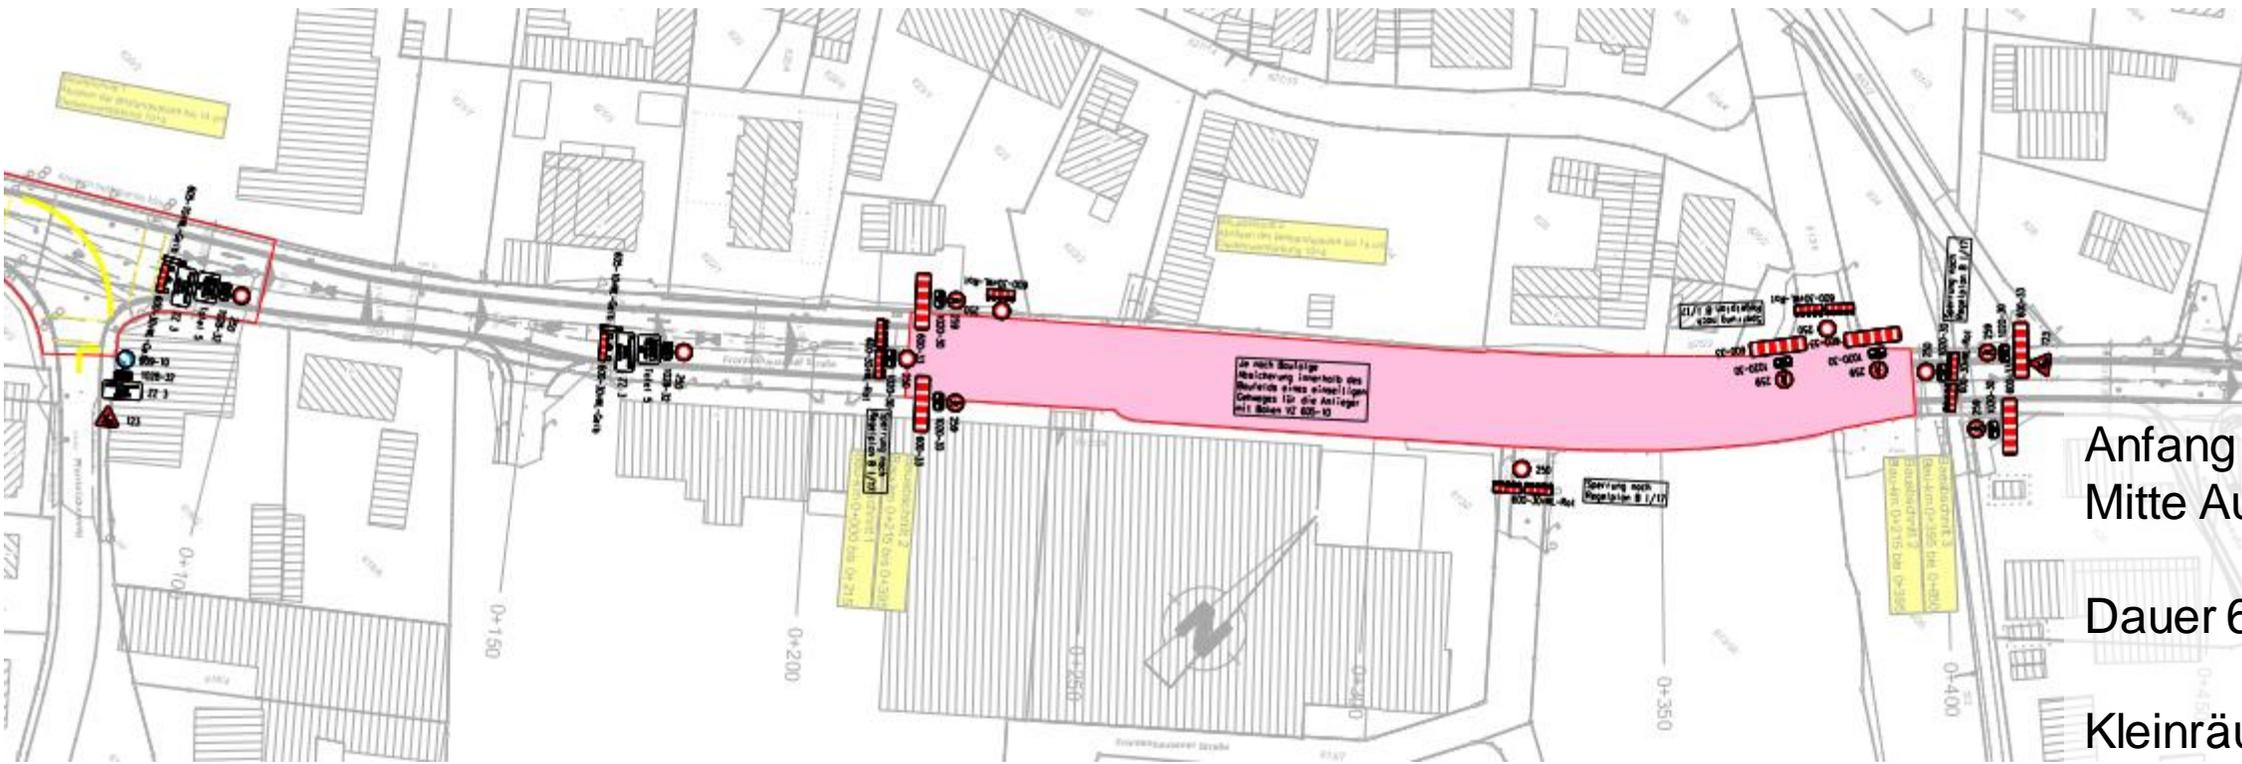

Anfang Juli bis
Mitte August 2022


Dauer 6 Wochen

Kleinräumige
Umleitung

Großräumige
Umleitung LKW

Bauablauf/ Bauphasen

Deckenbau Bauabschnitte BA 1 bis BA 3

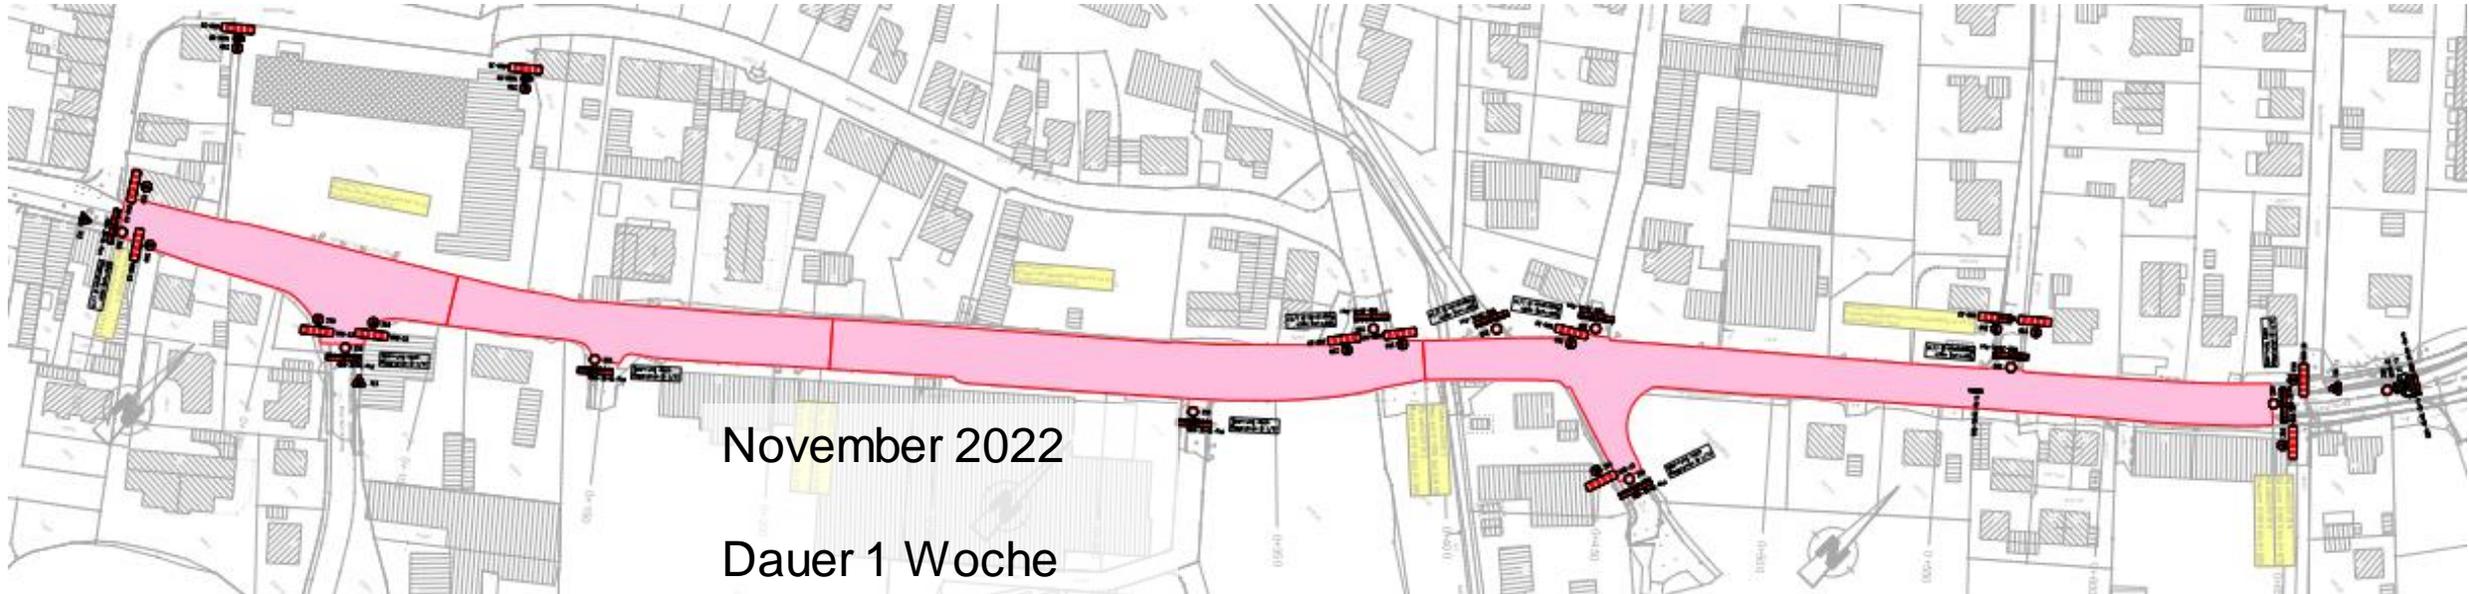


Kleinräumige
Umleitung

Großräumige
Umleitung LKW

Bauablauf/ Bauphasen

Bauabschnitt 4 – Bereich Zwischen Gartenstraße und Städtischem Bauhof

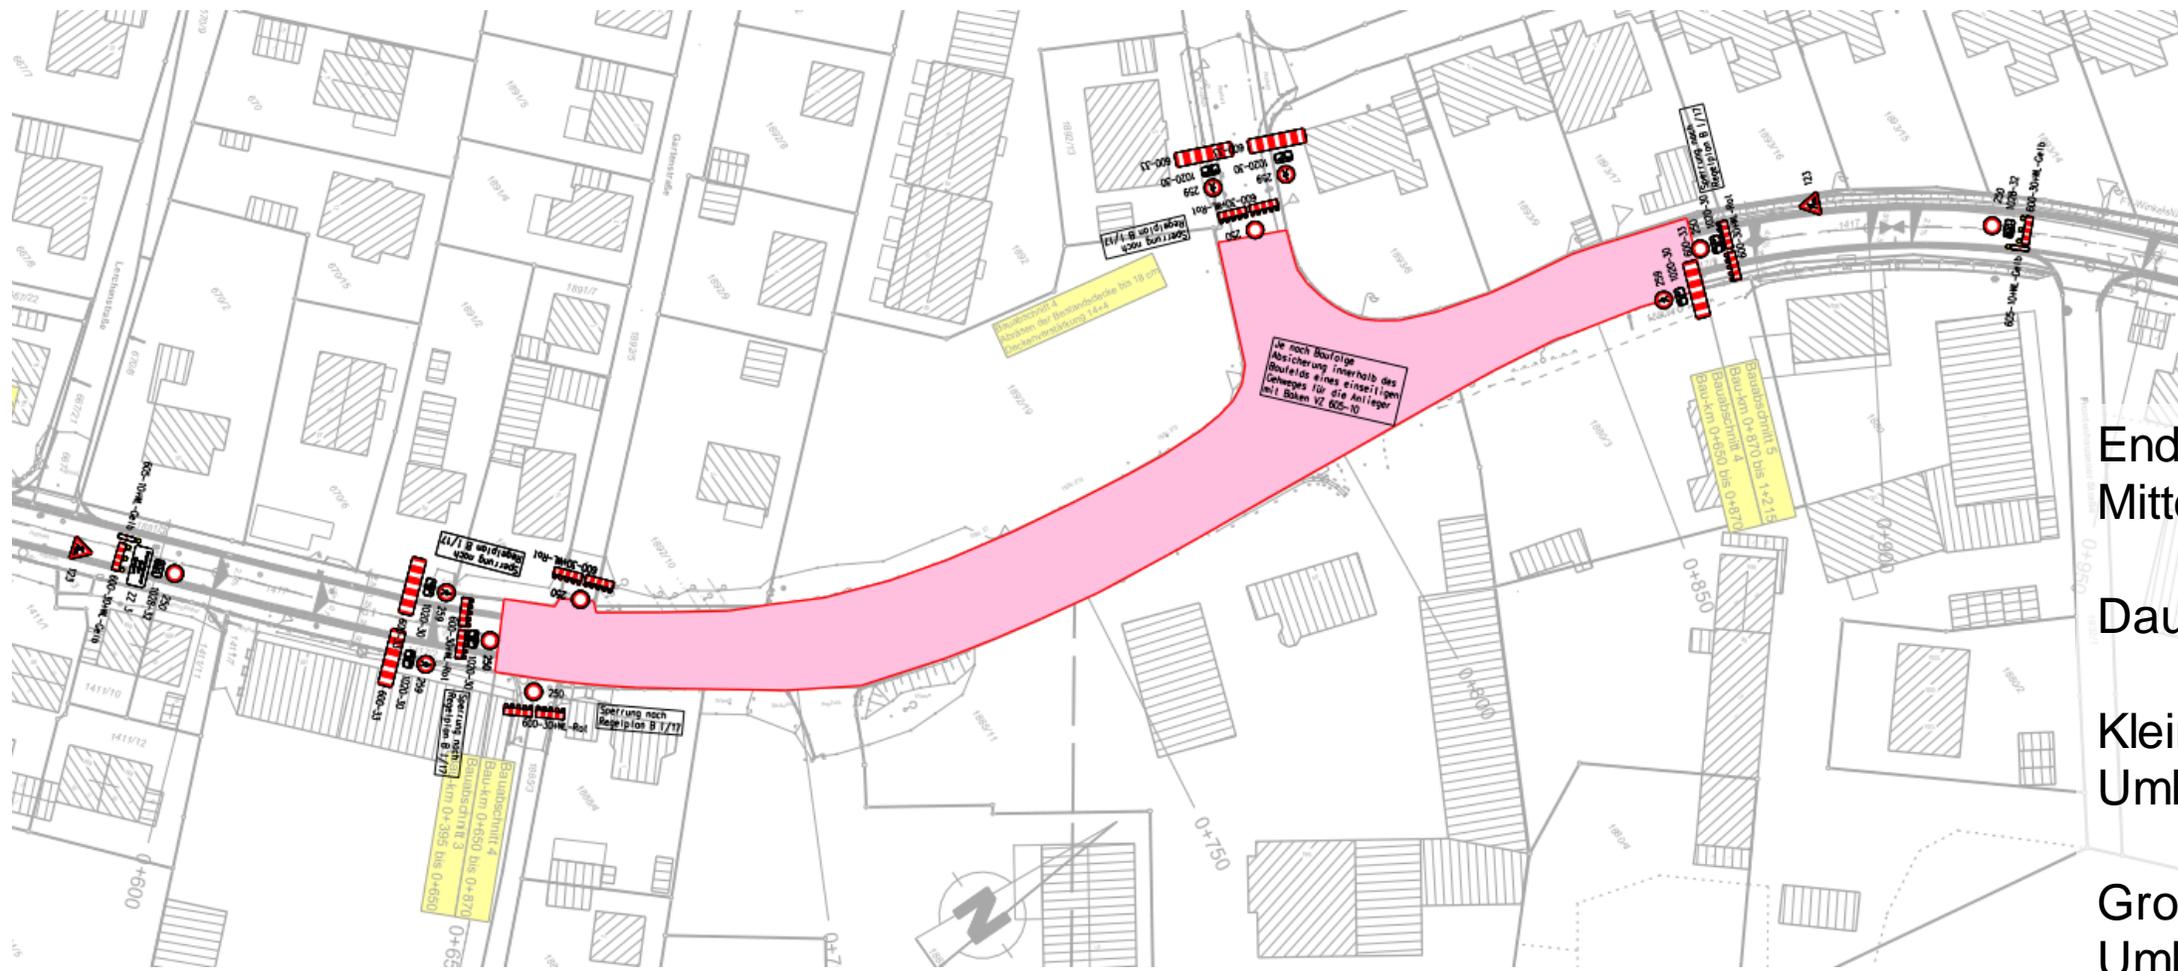

Ende März bis
Mitte Mai 2023

Dauer 7 Wochen

Kleinräumige
Umleitung

Großräumige
Umleitung LKW

Bauablauf/ Bauphasen


Bauabschnitt 5 – Bereich zwischen Bauhof und Schachtengraben

Mitte Mai bis
Mitte Juli 2023

Dauer 10 Wochen


Kleinräumige
Umleitung

Großräumige
Umleitung LKW

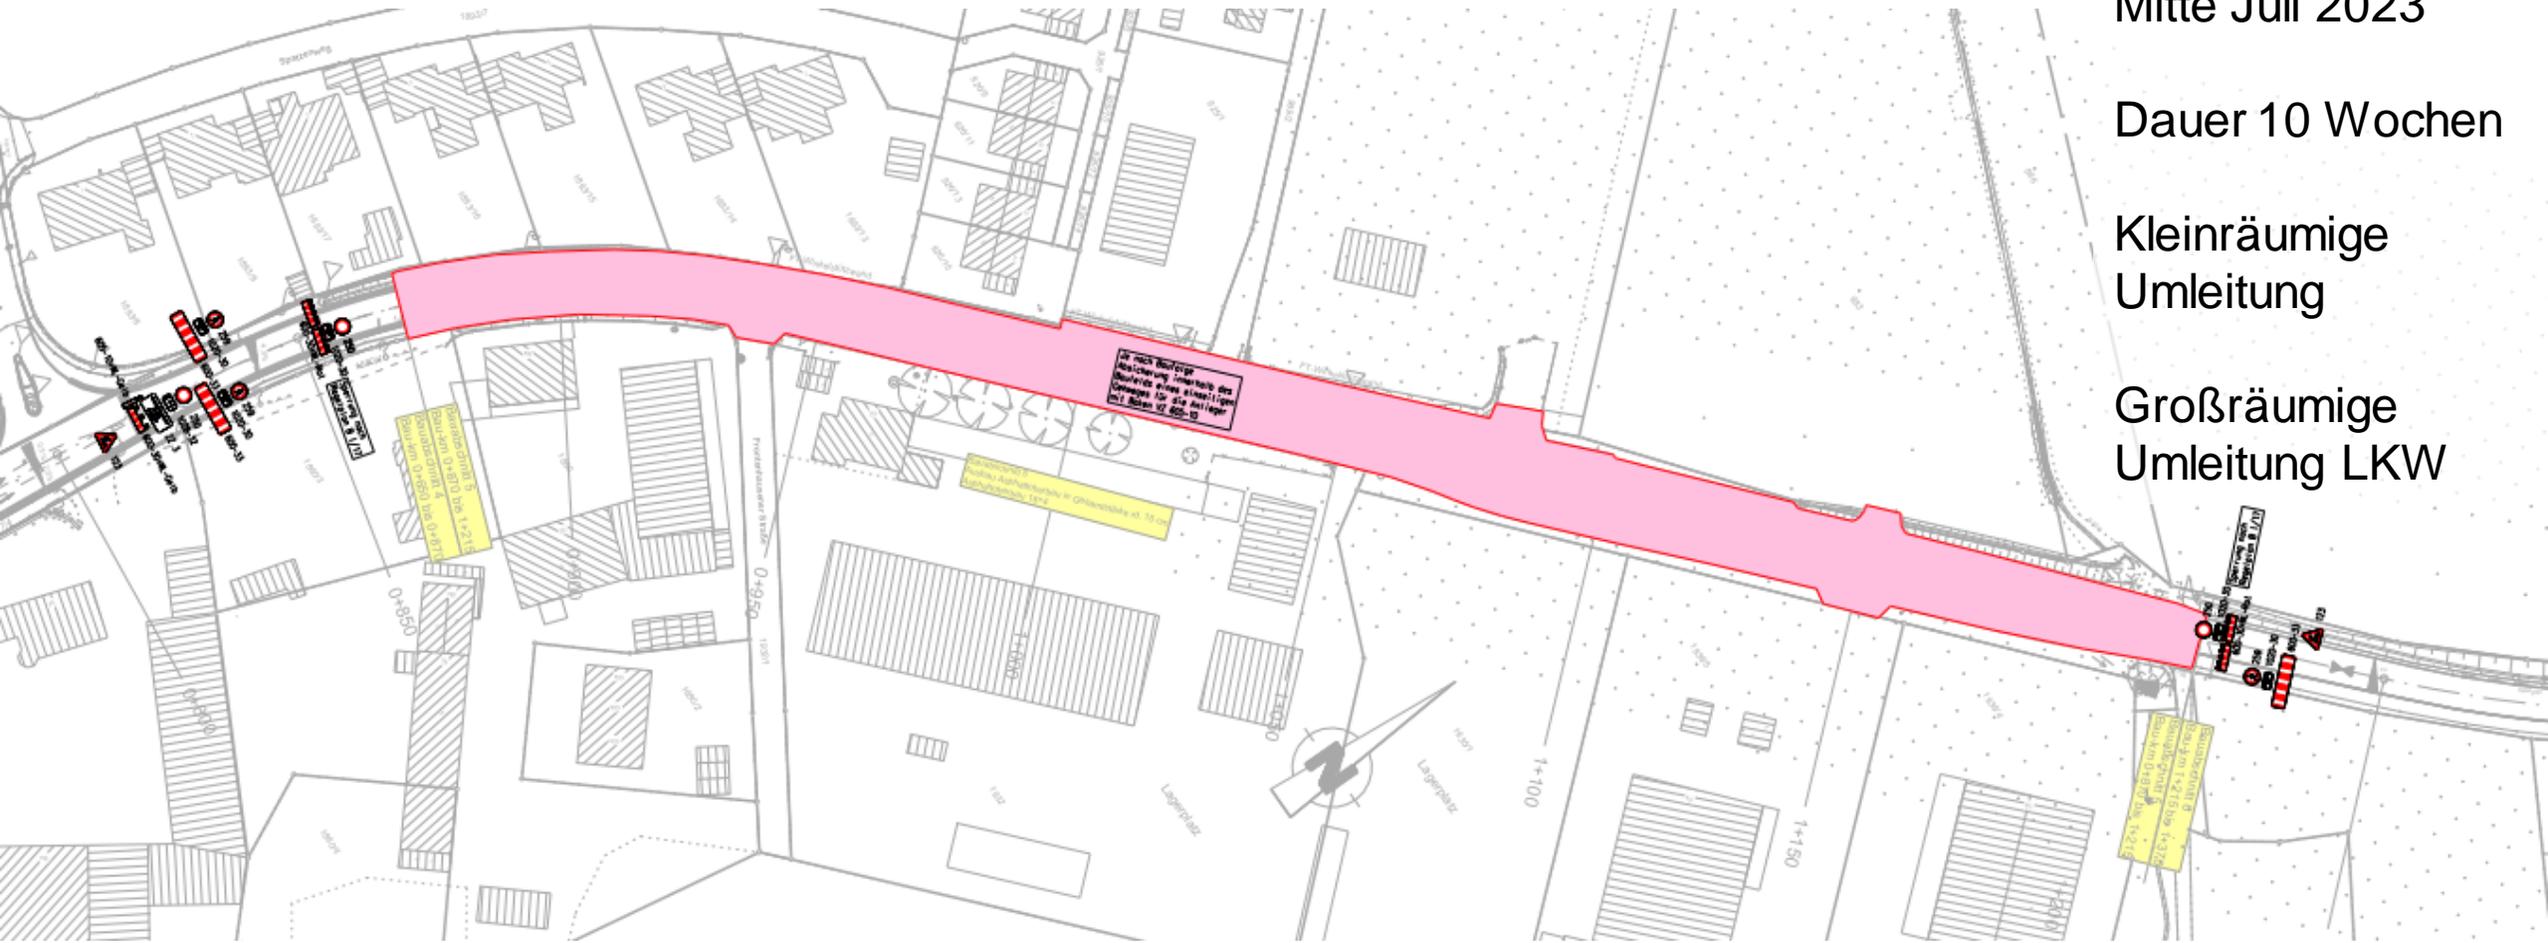

Bauablauf/ Bauphasen

Bauabschnitt 6 – Bereich zwischen Schachtengraben und Mühlen

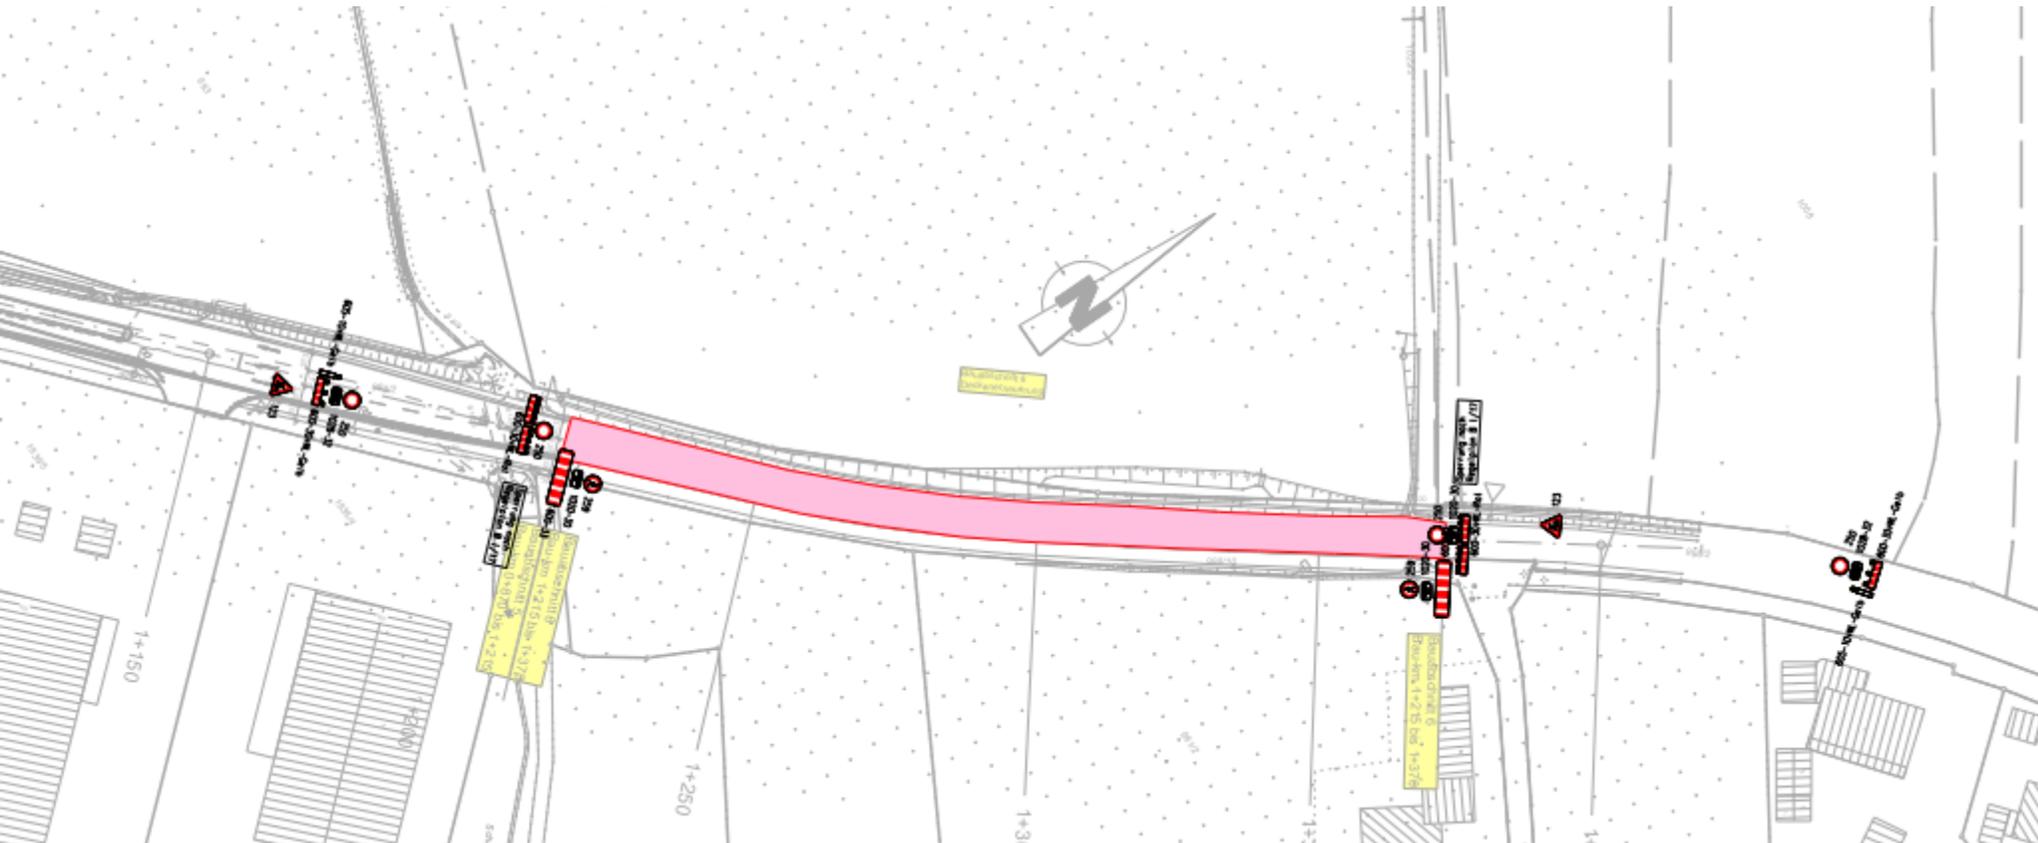

Ende Juli bis
Anfang August 2023

Dauer 2 Wochen

Kleinräumige
Umleitung

Großräumige
Umleitung LKW

Bauablauf/ Bauphasen

Deckenbau Bauabschnitte BA 4 bis BA 6



August 2023

Dauer 2 Wochen
Mit Restarbeiten

Kleinräumige
Umleitung

Großräumige
Umleitung LKW

Gesamtfertigstellung der St 2083 Frontenhausener Straße September 2023

